




COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO

Provincia di Potenza

**RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO
PINACOTECA - BIBLIOTECA d'ERRICO - 1° STRALCIO
CUP: B65J19001850005**

PROGETTO ESECUTIVO

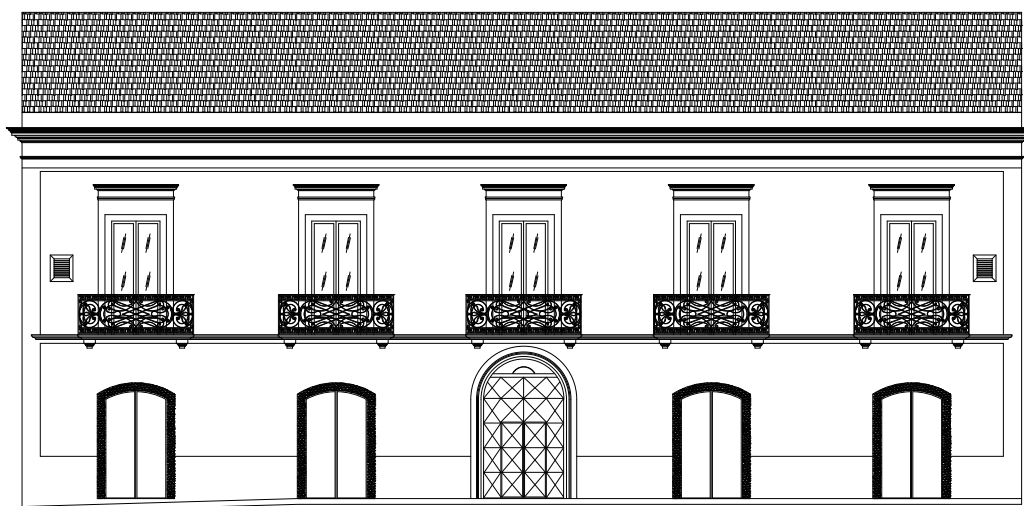

progettista

Ing. Domenico Orlando

Via Allamprese n.7, 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

p.e.o.: domenico.orlando2005@libero.it, p.e.c.: domenico.orlando2@ingpec.eu

coordinatore progetto

Arch. Felicetta De Bonis

Ufficio Tecnico

TAVOLA	14	SCALA	DATA	Novembre 2020
OGGETTO	Cronoprogramma dei lavori			
visti per approvazione				
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Clinco				

ALLEGATO "A"

Comune di Palazzo San Gervasio
Provincia di Potenza

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Recupero ed adeguamento funzionale del Palazzo Pinacoteca-Biblioteca - 1° stralcio

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale - Ente Morale "Camillo d'Errico".

CANTIERE: Corso Manfredi n.143, Palazzo San Gervasio (Potenza)

Palazzo San Gervasio, 21/11/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Orlando Domenico)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Sindaco protempore)

Ingegnere Orlando Domenico

Via Allamprese n. 7

85026 Palazzo San Gervasio (Potenza)

cell.: +39 338.178.8559

E-Mail: domenico.orlando2005@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	01/07/2020	01/07/2020
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	02/07/2020	02/07/2020
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	5	7	03/07/2020	09/07/2020
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	10/07/2020	10/07/2020
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	13/07/2020	13/07/2020
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	10/07/2020	10/07/2020
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	13/07/2020	13/07/2020
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	13/07/2020	13/07/2020
Rimozione di coperture e opere complementari						
Rimozione di canne fumarie o di aerazione	1	E	1	1	14/07/2020	14/07/2020
Rimozione di grossa orditura di tetto in legno	1	E	5	7	22/07/2020	28/07/2020
Rimozione di manto di copertura in tegole	1	E	4	6	16/07/2020	21/07/2020
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione	1	E	1	1	14/07/2020	14/07/2020
Rimozione di scossaline e canali di gronda	1	E	2	2	14/07/2020	15/07/2020
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano	1	E	2	2	29/07/2020	30/07/2020
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	7	11	31/07/2020	10/08/2020
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili	1	E	7	9	20/08/2020	28/08/2020
Struttura portante legno lamellare						
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare	1	E	1	1	07/09/2020	07/09/2020
Montaggio di arcarecci in legno lamellare	1	E	10	12	07/09/2020	18/09/2020
Montaggio di tavolame in legno lamellare	1	E	8	10	28/09/2020	07/10/2020
Verniciatura a pennello di opere in ferro	1	E	5	7	05/11/2020	11/11/2020
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione	1	E	5	5	21/09/2020	25/09/2020
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione	1	E	5	5	31/08/2020	04/09/2020
Realizzazione di murature in elevazione	1	E	7	9	11/08/2020	19/08/2020
Formazione intonaci esterni tradizionali	1	E	10	14	22/10/2020	04/11/2020
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	7	9	12/11/2020	20/11/2020
Ripristino manto di copertura						
Posa di manto di copertura in tegole	1	E	8	12	09/10/2020	20/10/2020
Opere complementari						
Realizzazione di canna fumaria prefabbricata	1	E	1	1	08/10/2020	08/10/2020
Realizzazione di comignolo prefabbricato	1	E	1	1	08/10/2020	08/10/2020
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	1	E	1	1	21/10/2020	21/10/2020
Montaggio di scossaline e canali di gronda	1	E	1	1	21/10/2020	21/10/2020
Montaggio di sistema fermaneve	1	E	1	1	21/10/2020	21/10/2020
Smobilizzo del cantiere						
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	3	3	23/11/2020	25/11/2020

Tabella Analitica Gantt

Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	26/11/2020	26/11/2020
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	27/11/2020	27/11/2020

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

